

目录

1. 目的 2

2. 适用范围 2

3. 术语 2

4. 职责 2

5. 程序 3

5.1 MP Liste 的分发 4

5.2 车型升级清单的梳理以及评价 4

5.3 MP 讲评以及认可推荐 6

6. 更改记录 7

7. 标准文件 7

拟制日期		审核日期		审核日期		批准日期	
拟定人		审核人		审核人		批准人	

1. 目的

该文件描述/规定项目管理标准和流程，目的在于规范 TEBS 相关工程师在针对车型升级清单的认可过程中的工作方式以及方法，明确各个工作领域及范围的工作职责，其工作内容不仅仅限于本流程所述的内容。

2. 适用范围

该流程适用于所有新项目和 PA。

目前限制在初步评估升级清单后不需要额外增加安全试验的情况。

3. 术语

TEBS(Technische Entwicklung - Body Safety) – 技术开发 车身开发部 车辆安全科；

EKS – VW 车辆安全部门

EK5 – Audi 车辆安全部门

TEBS-P-Ing. (ProjektIngenieur) – 车辆安全科项目工程师

TEBS-V-Ing.(VersuchIngenieur) – 车辆安全科试验工程师

EKS/EK5- P-Ing. – 德方 VW 和 Audi 项目工程师

EKS/EK5-V-Ing.(VersuchIngenieur)- 德方 VW 和 Audi 试验工程师

FOP (father of part)– 零部件之父，零部件设计工程师

VT(Versuchstraeger)-试验车

TEBS(Technische Entwicklung - Body Safety) – 技术开发 车身开发部 车辆安全科；

4. 职责

TEBS-P-Ing 负责 TEBS 范围车型升级清单（来源为 I/EK5）的分发及信息整理以及收集

拟制日期		审核日期		审核日期		批准日期	
拟定人		审核人		审核人		批准人	

车辆安全项目管理标准和流程

标号: xxTEBSxxxx

版次: 2

生效日期: 2019.xx.xx

页数:


工作, 将作为 TEBS 的统一出口想 I/EK-5 方面反馈清单评估结果及认可签字文件的准备和分发。若升级清单的评价内容涉及到试验项目, 试验相关数据在 Visverdi 中的传输存储状态也需要 TEBS-P-ing 跟踪并汇总。

TEBS-V-ing 以及 BTV 负责在 TEBS-P-Ing 梳理并分车型升级清单后, 对所负责的车型升级点进行评估并给出评估依据。必要时需要负责同车型更改点的提出者以及 I/EK5 的同事进行沟通, 确认更改点信息。

TEBS 专业组长以及经理负责对 MP Liste 的评价进行最终把关并在相关推荐表格上签字。

5. 程序

根据 WWW 原则, 针对 MP Liste 的评价以及相关认可工作核心工作流程可由下述图表表示出:

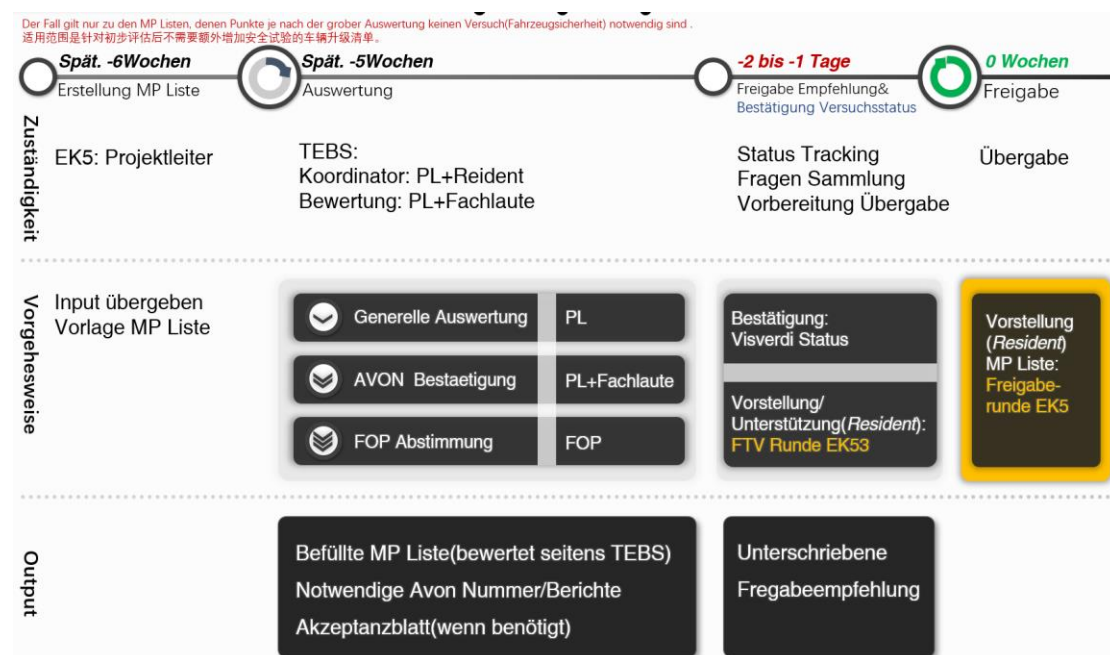

此图表展示了 I/EK5 以及 TEBS 不同领域的工程师在针对 MPListe 的评价以及推荐认可的过程中所担任的不同的角色与分工。

拟制日期		审核日期		审核日期		批准日期	
拟定人		审核人		审核人		批准人	

5.1 MP Liste 的分发

I/EK-5 PL 负责车型升级清单（下文简称 MP）的发布（此发布并非原始发布，原始发布来自于 AUDi G 部门，发布再本文中的意义是将车型升级清单整理分发到 TEBS-P-Ing 手中）。

此事件发生的节点应在需要 TEBS 提供认可推荐签字表格的至少 6 周前，以保证 TEBS 相关工程师有足够的时间了解升级清单信息并作出评价。

5.2 车型升级清单的梳理以及评价

5.2.1 TEBS-P-Ing 在得到 MP 之后，应第一时间针对 MP 内容进行梳理于初步评价，过滤 MP 中明显与车辆安全领域不相关的内容，并在相关栏目中点选 i.O.（此处意义为无关），并在 Bemerkung 中注释出来无关的原因及背景。同时梳理不同的更改升级点的侧重评价负责领域（比如说正碰相关或者是零部件相关等等），将梳理后的文件分发给个此项目组织机构内各个工作方向负责的工程师手中（邮件形式或其他电子版形式）并确保相关工程师知情。正常情形下，比步骤时间不应超过一周。

5.2.2 TEBS-V-Ing 以及 BTV 在得到 MP 后，应尽快对清单内容进行评价，注意清单中标有 FTV 的一列不应被改动，其将在后续 i/EK5 FTV Runde 上进行状态汇报时由 EK5-FTV 同事负责填写。

TEBS-V-Ing 以及 BTV 应首先根据个人经验以及 MP 中的描述的升级内容进行初步评价，如在此过程中已经可以进行决定评价结果，请在 MP 中相应的评价栏输入评价结果，并在 Bemerkung 中粗略标注评价原则，若涉及到相关项目试验或者参

拟制日期		审核日期		审核日期		批准日期	
拟定人		审核人		审核人		批准人	

考项目试验,请在相应信息输入区域输入 Visverdi 中的试验号,用于 FTV 进行查询并审核。

在进行初步评价之后,TEBS-V-Ing 应针对自己所负责的更改点所提供的更改号码在 AVON 系统中进行跟踪查询,必要时需要联系更改相关方(源头)确认更改细节,以确认 MP 中内容以及评价的准确性。同时梳理出无法评估(语言原因、专业原因等)并反馈给 TEBS-P-Ing。

正常情形下,此步骤时间不应超过两周。

5.2.3 TEBS-P-Ing 在计划汇报的 FTV 会议前三周,应该得到 TEBS 不同专业方向工程师的所有 MP 评价反馈,并汇总,汇总后,应针对所有 MP 点进行一次轮询(重新确认评价根据及内容),并针对 MP 中无法明确评价的升级点(如果有),组织电话会,同 EK-5 PL 进行沟通确认,获取无法明确评价的升级点的细节信息以及评价所需要的可能的资源(AUDI 相关联系人,EK5 提供的帮助、确认邮件等),在此之后完成对 MP 的评价,注意!:如果针对 MP 中无法明确评价的升级点,在得到 EK5 或者 AUDI 的反馈以及确认内容后,应在 MP 评价栏或 Bemerkung 栏目中指出,并在最终的认可推荐签字页面中有所体现。

5.2.4 TEBS-P-Ing 在完成了 MP 评价之后,应准备认可推荐表,准备着手签字流程。同时通知 EK5 PL,确认 FTV 审核会议时间以及 EK5 Projekt Runde 的时间,用于获得安全最终认可。

拟制日期		审核日期		审核日期		批准日期	
拟定人		审核人		审核人		批准人	

5.3MP 讲评以及认可推荐

5.3.1 在 TEBS-P-Ing 完成了 MP 评价之后, 应组织 MP 汇报, 向相关专业组长以及经理讲评 (也可能不需要), 之后专业组长以及经理根据讲评情况针对相对应此 MP 的认可推荐表上签字 (或者不签字) (若没有签字, 流程定义需要更新, 此处暂时不列出)。

5.3.2 签字完成后, TEBS-P-Ing 需要在第一时间联系 EK5 PL, 上报项目议题, 并再次确认 FTV Runde 以及 Projekt Runde 的时间, 并做好汇报准备。

5.3.3 经过 FTV Runde 以及 Projekt Runde 后, 完成 EK5 内部的 MP 认可流程, 同时宣告 TEBS 的 MP 认可推荐流程结束 (如 EK5 内部没有签字, 流程定义需要更新, 此处暂时不列出。)

重要! Resident (如果有) 应该在流程中的 5.2.1、5.2.2、5.2.3 以及 5.3.2 环节中紧密参与, 其中在 FTV Runde 以及 Projekt Runde 中做 MP 讲评以及项目状态汇报, 并确保最终得到认可签字。

拟制日期		审核日期		审核日期		批准日期	
拟定人		审核人		审核人		批准人	

车辆安全项目管理标准和流程

标号: xxTEBSxxxx

版次: 2

生效日期: 2019.xx.xx

页数:

1 MP Liste durchschauen	- Vorbereitung: alle MP Punkte in AVON überprüfen und bewerten - Erklärungsmaterialien zur Bewertung der Liste(meister sind i.O/n.i.O/b.i.O) mitbringen - MP Liste in der Runde zeigen
2 Erklärung der Punkte (außer n.b.)	- Meinung/Erklärung von Projektleiter oder Fachleute über Punkte die i.O/n.i.O/b.i.O sind. - Entsprechende Materialien erläutern, z.B. Az.Blatt/Versuchsnummer/Referenzversuchsnummer/Auswertungsunterlage usw.
3 Visverdi Status Tracking	- Versuchsdaten/Bewertung durchschauen(nur Übergreifende INFO aber wichtig!) diese Versuche spielen die Rollen zu der Bewertung der i.O/n.i.O/b.i.O Punkte. Wenn Versuch in Visverdi nicht abgeschlossen, muss der entsprechende Punkte in MP Liste wieder zu Rot/n.i.O sein(MP Liste mit Kommentare), da kann es bei der nächsten Runde weiterverfolgt.
4 Fragestellung Wie Q&A	- Bitte antworten alle Fragen in der Runde gestellt - Wenn nicht inzwischen antwortfähig, muss den Punkt nachher klärt werden (bei nächster Runde).
5 Punkte mitnehmen Abschluss	- Wie oben Etagen beschrieben, wenn noch Open Points gibt, Klärung bei nächster Runde. - Wenn alles(Visverdi/Az.Blatt/ohne n.i.O usw) grün ist, Freigabeempfehlung/Freigabedokumente werden von Chefs unterschrieben→Anlauf** fertig.

6. 更改记录

7. 标准文件

待更新

拟制日期		审核日期		审核日期		批准日期	
拟定人		审核人		审核人		批准人	
