

目录

1. 目的 2

2. 适用范围 2

3. 术语 2

4. 职责 3

5. 程序 3

5.1 项目信息及状态管理 5

5.1.1 Jobsplit 与 AWS 确认; 5

5.1.2 项目移交 5

6. 更改记录 5

7. 标准文件 5

拟制日期		审核日期		审核日期		批准日期	
拟定人		审核人		审核人		批准人	

1. 目的

该文件描述/规定技术开车身开发部车辆安全科奥迪项目移交工作的流程，用以明确车辆安全科室各个方向工程师的主要职责，明确在奥迪项目交接的过程中应该遵守的时间节点以及工作的主要任务，以及项目移交过程中需要跟踪以及提供的必要交付物。最终目的是通过此流程保证奥迪项目在车辆安全领域范围移交的平顺以及清晰。文中所描述的工作内容及步骤在考量具体项目时应具有可调整性，及根据项目复杂程度的不同，双方工程师有权利精简或者增加适当的流程步骤以及工作内容，以期达到项目平稳交接的目的。本文所述内容谨作为奥迪项目移交工作的核心内容的参考。

2. 适用范围

该流程适用于所有奥迪将要移交给一汽大众的所有新项目和 PA（或升级）项目。

3. 术语

TEBS(Technische Entwicklung - Body Safety) – 技术开发 车身开发部 车辆安全科；

EKS – VW 车辆安全部门

EK5 – Audi 车辆安全部门

T-RHSV- TEBS 约束系统工程师

TEBS-P-Ing. (ProjektIngenieur) – 车辆安全科项目工程师

TEBS-V-Ing.(VersuchIngenieur) – 车辆安全科试验工程师

EKS/EK5- P-Ing. – 德方 VW 和 Audi 项目工程师

EKS/EK5-V-Ing.(VersuchIngenieur)- 德方 VW 和 Audi 试验工程师

FOP (father of part)– 零部件之父，零部件设计工程师

拟制日期		审核日期		审核日期		批准日期	
拟定人		审核人		审核人		批准人	

VT(Versuchstraeger)-试验车

Stellungnehmerliste 负责人（反馈人）清单

BTV（Bauteile Verantwortlicher）零部件负责人（专业负责工程师）

Schnittstellendokument 信息确认交互文档

OE-4 Leiter 奥迪专业组长（组织机构层级为 4）

AE(Aenderungserlaubnis)-更改许可

Stellungnahme 信息反馈

4. 职责

TEBS-P-Ing 负责同 AUDI EK5 的 PL 进行主要对接，并实时汇总项目移交状态，跟踪整个项目的移交进度。BTV 负责对项目某个专业方向的问题进行汇总并同 EK5 的 BTV 进行实时沟通，监控此专业方向的移交情况，并汇总到 TEBS-P-Ing 处。

5. 程序

整个项目移交的时间跨度将横跨 12 周时间，其核心流程将遵照 WWW 模型由下述图片展示出来：

拟制日期		审核日期		审核日期		批准日期	
拟定人		审核人		审核人		批准人	

车辆安全项目管理标准和流程

标号: xxTEBSxxxx


版次: 2

生效日期: 2019.xx.xx

页数:



针对 PA/NF 项目, 其流程将有所精简, 时间跨度也会适时减少, WWW 模型流程图如下:

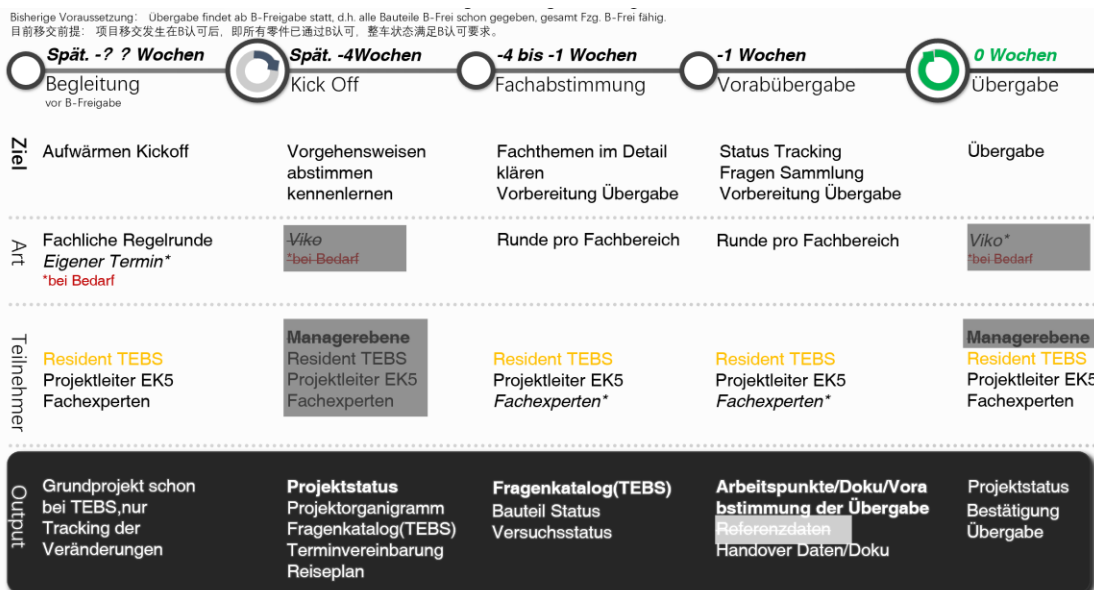

目前移交节点为 B 认可, 此处所说的 B 认可是指 EK5 方面完成项目层面在安全领域的 B 认可以及零部件层面获得了 B 认可, 一般来说, 二者缺一不可, 特殊情况下允许在个别零部件仍未拿到 B 认可的前提下进行最终的移交, 但需要相关移交确认文档中明确指出此类事项并注明此零部件最终的建议移交时间。

拟制日期		审核日期		审核日期		批准日期	
拟定人		审核人		审核人		批准人	

5.1 项目信息及状态管理

5.1.1 Jobsplit 与 AWS 确认;

5.1.2 项目移交

在 AWS 和 Jopsplit 谈判中既定的移交节点后 8 周内, TEBS-P-Ing 负责组织 TEBS 科室内部项目相关工程师, 按照《**车辆安全科项目移交标准内容**》完成安全相关内容移交并存档;

TEBS-P-Ing 负责与 EKS/EK5-P-Ing 确定正式移交 Workshop 时间点, 并在 TEBS 科室内部负责组织项目相关工程师参与项目移交;

移交 Workshop 前 TEBS-P-Ing 负责推动 EKS/EK5-P-Ing 提前分发项目移交报告, TEBS-P-Ing 负责组织科室内部相关同事解读移交报告内容, 识别项目移交的不确定点和问题点;

TEBS-P-Ing 负责组织移交 Workshop, 推动关闭项目移交时的不确定点, 并跟踪项目移交时的问题点;

移交 Workshop 后 1 周内, TEBS-P-Ing 负责在 TEBS1 例会上展示项目移交成果, 不确定点和问题点及其后续措施。

6. 更改记录

7. 标准文件

拟制日期		审核日期		审核日期		批准日期	
拟定人		审核人		审核人		批准人	
